



**Projektvorbericht Juli 2023:  
Ewusiejoe M/A Girls Junior High School  
Schulbau- und WasH-Projekt  
Förderer: Jerome Evans und Freunde**

**Madamfo Ghana Bettina Landgrafe e.V.**

Voerder Str. 139a | 58135 Hagen | Tel.: 02331-1278278

Mobil: 0162 7702867 | mail: [madamfo@ghana.de](mailto:madamfo@ghana.de) | [www.madamfo-ghana.de](http://www.madamfo-ghana.de)

# Das Projektgebiet – Ewusiejoe Biakakrom, Western Region



# Projektvorstellung

## **Projekthintergrund:**

Ewusiejoe ist eine Stadt im Ahanta-West District in der Western Region mit ca. 7.000 Einwohnern.

Die Bildung von Mädchen hat in vielen Ländern Afrikas immer noch keinen hohen Stellenwert. Ein Großteil der Bevölkerung meint, Mädchen sollten lediglich auf die Ehe vorbereitet werden. Dies führt oft zu Schulabbrüchen und Teenagerschwangerschaften.

Die Ewusiejoe M/A Girls Model JHS wurde 2016 gegründet mit dem Ziel, Mädchen selbstständig und unabhängig zu machen.

Leider fehlt es der Gemeinde an ausreichend Mitteln, die Schule in einen guten Zustand zu bringen. Die ca. 400 Schülerinnen vom Kindergarten bis zur Junior High School sind in einer notdürftigen Holzkonstruktion mit lediglich 2 Klassenzimmern untergebracht. Dort sind sie der Witterung und herumstreunenden Tieren schutzlos ausgeliefert. Ein konzentrierte Lernen ist so gar nicht möglich.

Schulmöbel sind nicht ausreichend vorhanden, so dass ein Großteil der Kinder auf dem Boden sitzen muss.

Toiletten oder sauberes Trinkwasser gibt es nicht. Die Kinder müssen vor Unterrichtsbeginn erst nach Wasser suchen und kommen deshalb häufig zu spät. Aufgrund der Wasserentnahme aus unsicheren Quellen grassieren zudem häufig Durchfallerkrankungen.

# Projektvorstellung

---

**Projektvorhaben:**

Bau eines neuen Schulblocks mit 6 Klassenzimmern, Lehrerzimmer, Lagerraum, Computerraum, Schulmöbeln sowie eines Toilettenhäuschens und einer mechanisierten Wasserversorgung.

**Zielgruppe:**

434 Schülerinnen und 10 Lehrkräfte sowie weiteres Schulpersonal

**Status:** in der Durchführung

**Kosten:** ca. 83.000€

# Projektvorstellung


---

## **Projektziele:**


- Zugang zu Bildung für alle Schüler im schulpflichtigen Alter
- Zugang zu sauberem Wasser und angemessenen sanitären Einrichtungen mit Handwaschanlagen
- Förderung und Schulung im Bereich Hygiene
- Deckung des Trinkwasser- und Nutzwasserbedarfs der Schule und des Dorfes
- Ermöglichung des Schulbesuchs für Mädchen auch während ihrer Menstruation
- Verbesserung des Bildungsstandards
- Reduzierung von Teenagerschwangerschaften
- Reduzierung wasserbedingter Krankheiten

# Voraussichtlicher Zeitplan

---



# Baupläne (Schulgebäude)

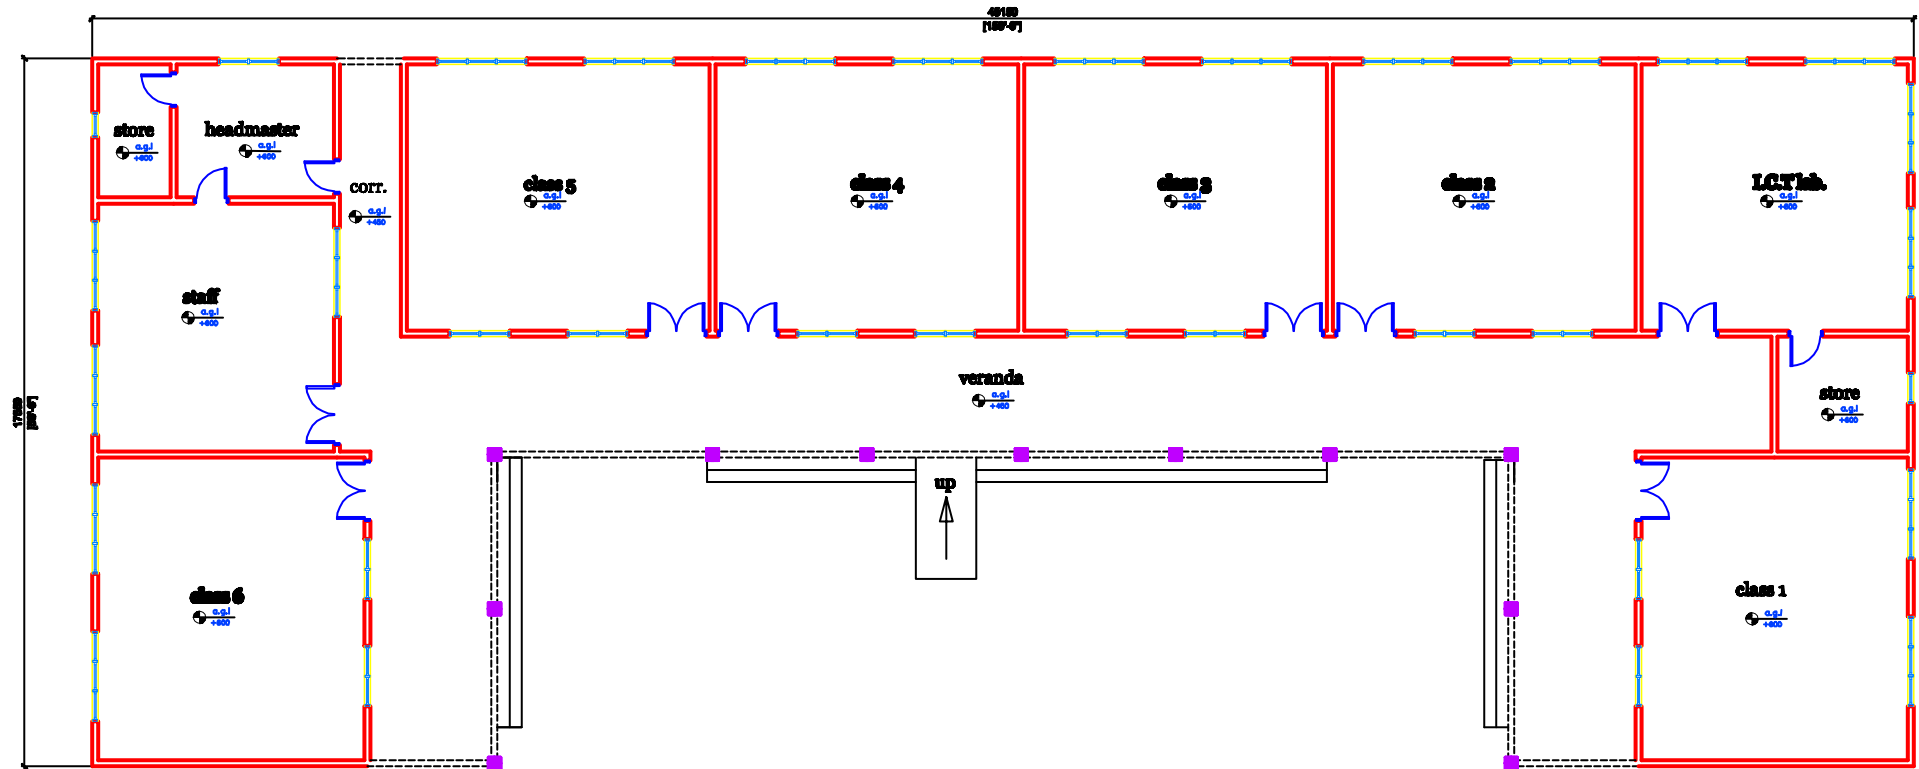

EWUSIEJOE M/A GIRLS MODEL SCHOOL


# Baupläne (Schulgebäude)

---





# Baupläne (Toiletten)

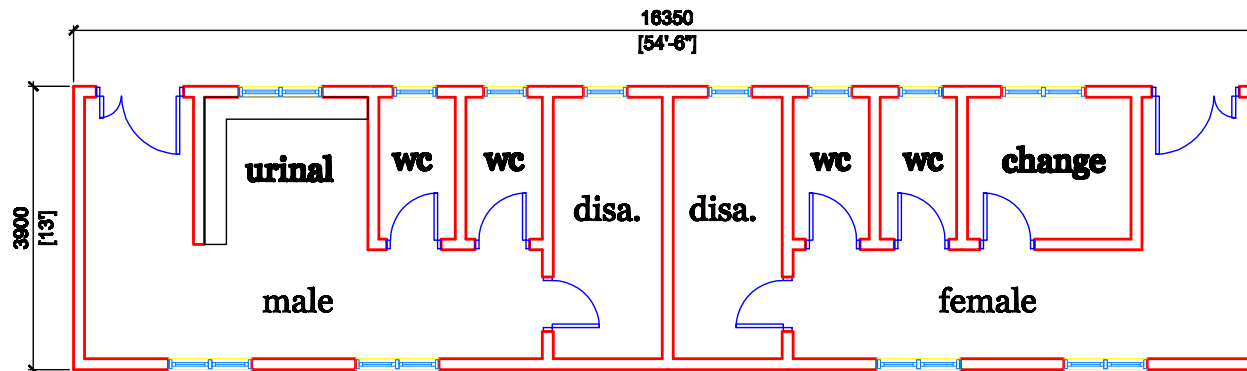

**6-SEATER TOILET FOR EWUSIEJOE M/A GIRLS MODEL SCHOOL**

# Baupläne (Toiletten)



# Antrag

Ewusiejoe M/A Girls Model  
Post Office Box 70  
Agona Ahanta  
26<sup>th</sup> November, 2021

Madamfo Ghana Foundation  
Post Office Box RP 64, Chirapatre  
Kumasi

Dear Sir / Madam

## REQUEST FOR ASSISTANCE-11 UNIT CLASSROOM BLOCK

Ewusiejoe M/A Girls Model J.H.S being a school known for training, educating and grooming poor children requires your generous attention in the form of a 11 unit classroom block.

Your donation and help can bring a smile to millions of faces helping them to improve teaching and learning at Ewusiejoe M/A Girls Model which has a population of four hundred and thirty four. The school was established 5 years ago with aim of training the girl – child to be independent and self – reliant but this have been slowed because of the lack of classroom blocks.


We plead with you to provide us with classroom block to improve the girl – child education in the Ahanta – West Municipal.


We count on your co – operation.

Thank you.

Yours faithfully,

  
.....  
Mrs. Dorcas Hagan  
(Head Mistress)

  
.....  
Hon. John Odoom  
Assembly Member  
Ewusiejoe Electoral Area

  
.....  
Nana Asabre III  
Chief of Ewusiejoe – Biakakrom









23 November 2021  
Integrated Science

farming tools  
① hoe  
② cutlass  
③ garden fork  
④ Rake  
⑤ Wheel barrow

at see it  
TANC  
C  
M  
P  
S  
S  
P  
P  
G  
M

3





Das Baugrundstück: Hier soll die neue Schule gebaut werden.





# Projektbericht

---

## **Februar 2023:**

Mitte Februar haben die Arbeiten am Projekt begonnen. Die Fläche wurde für den Bau der Schule vorbereitet und die Arbeiten am Fundament haben begonnen. Momentan läuft die Herstellung der für den Bau benötigten Ziegel.

Am 25. Februar konnte die Brunnenbohrung erfolgreich durchgeführt werden. In ca. 75 Metern Tiefe stieß der Bohrer auf Wasser.

## **März – Mai 2023:**

Das Schul- und auch das Toilettengebäude sind bis zum Dachlevel fertig gemauert. Die Klärgrube wurde ausgehoben. Als nächstes erfolgt die Konstruktion des Dachstuhls.

## **Juni – Juli 2023:**

Anfang Juni haben die Konstruktion des Dachstuhls und die Dacheindeckung begonnen. Die Arbeiten mussten jedoch aufgrund extremer Regenfälle häufig pausieren. Momentan hat der Regen nachgelassen und es kann wieder voll gearbeitet werden.

Nach Fertigstellung der Dächer werden Türen und Fenster eingesetzt und die Gebäude verputzt.

WBS	TASKS	COMPLETION
<b>1</b>	<b>Preparation</b>	
1.1	Meeting and site visit	100%
1.2	Organising & conveying first materials to site	30%
1.3	Blocks moulding	100%
<b>2</b>	<b>Borehole Mechanisation</b>	
2.1	Borehole drilling	100%
2.2	Water Tank Platform construction and installation	100%
2.3	Pipes laying and water pump installation	100%
2.4	Water Pump installation and electrical works	100%
<b>3</b>	<b>School Building Foundation</b>	
3.1	Laying of footing	100%
3.2	Filling, compacting of footings	100%
3.3	Casting of foundation concrete	100%
3.4	Steel bending work and dwarf pillars	100%
3.5	Filling and compacting of footings	100%
3.6	Pillars formation	100%
<b>4</b>	<b>School Building Wall</b>	
4.1	Laying of block on oversite concrete	100%
4.2	Forming of window and door frames	100%
4.3	Fixing of window and door frames	100%
4.4	Forming of lintel form work	100%
4.5	Iron rod beam in the form work	100%
4.6	Casting of lintel concrete	100%
4.7	Dry and removal of boards	100%
4.8	Laying of blocks on the lintel to form gable	100%
<b>5</b>	<b>Toilet &amp; Manhole</b>	
5.1	Toilet foundation works	100%
5.2	Toilet wall building	100%
5.3	Toilet Roofing	Pending
5.4	Digging of Manhole	100%
5.5	Manhole (Superstructure)	100%
5.6	Manhole (finishing works)	100%
5.7	Toilet and fitting installation	Pending
<b>6</b>	<b>Roofing (Main Building)</b>	100%
6.1	Form basis for roofing	Pending
6.2	Fixing of roofing sheet	



EWUSIEJO  
DR. MARY SCHOOL

















Ewusiejeje  
M/A GIRLS MODEL  
JUNIOR HIGH SCHOOL

Jerome Evans and Friends

MADAMMO GHANA FOUNDATION  
www.madammo.org.gh

MADAMMO GHANA FOUNDATION  
FOR  
RURAL DEVELOPMENT

 **Ewusiejoe**  
M/A GIRLS MODEL  
JUNIOR HIGH SCHOOL 

Funded by:

**Jerome Evans and Friends**

led by:  
MADAMFO GHANA FOUNDATION  
[www.madamfo-ghana.de](http://www.madamfo-ghana.de)

WORKING HOURS CLUBING  
MONDAY - FRIDAY SATURDAY  
10:00AM - 10:00PM 10:00PM -  
LOCATION: EWUSIEJOE BEHIND M/A PRIMAR  
AVAILABLE SPACE FOR ALL OCCA  
0555061604 / 05986618















Ewasielone  
M.A. WALL'S MEMORIAL  
JUNIOR HIGH SCHOOL  
Jerome Evans and Friends











## Partners in Development



### Spendenkonto:

Sparkasse an Volme und Ruhr

IBAN: DE77450500010101900090

SWIFT: WELADE3HXXX

Madamfo Ghana Bettina Landgrafe e.V. | Voerder Str. 139a | 58135 Hagen

Tel: 02331-1278278 | Mobil: 0163-7703867 | [mail@madamfo-ghana.de](mailto:mail@madamfo-ghana.de) | [www.madamfo-ghana.de](http://www.madamfo-ghana.de)

[facebook.com/madamfo-ghana](https://facebook.com/madamfo-ghana) | [Instagram.com/madamfo-ghana](https://Instagram.com/madamfo-ghana)
